


Faseopdelt BYGGEPROCES



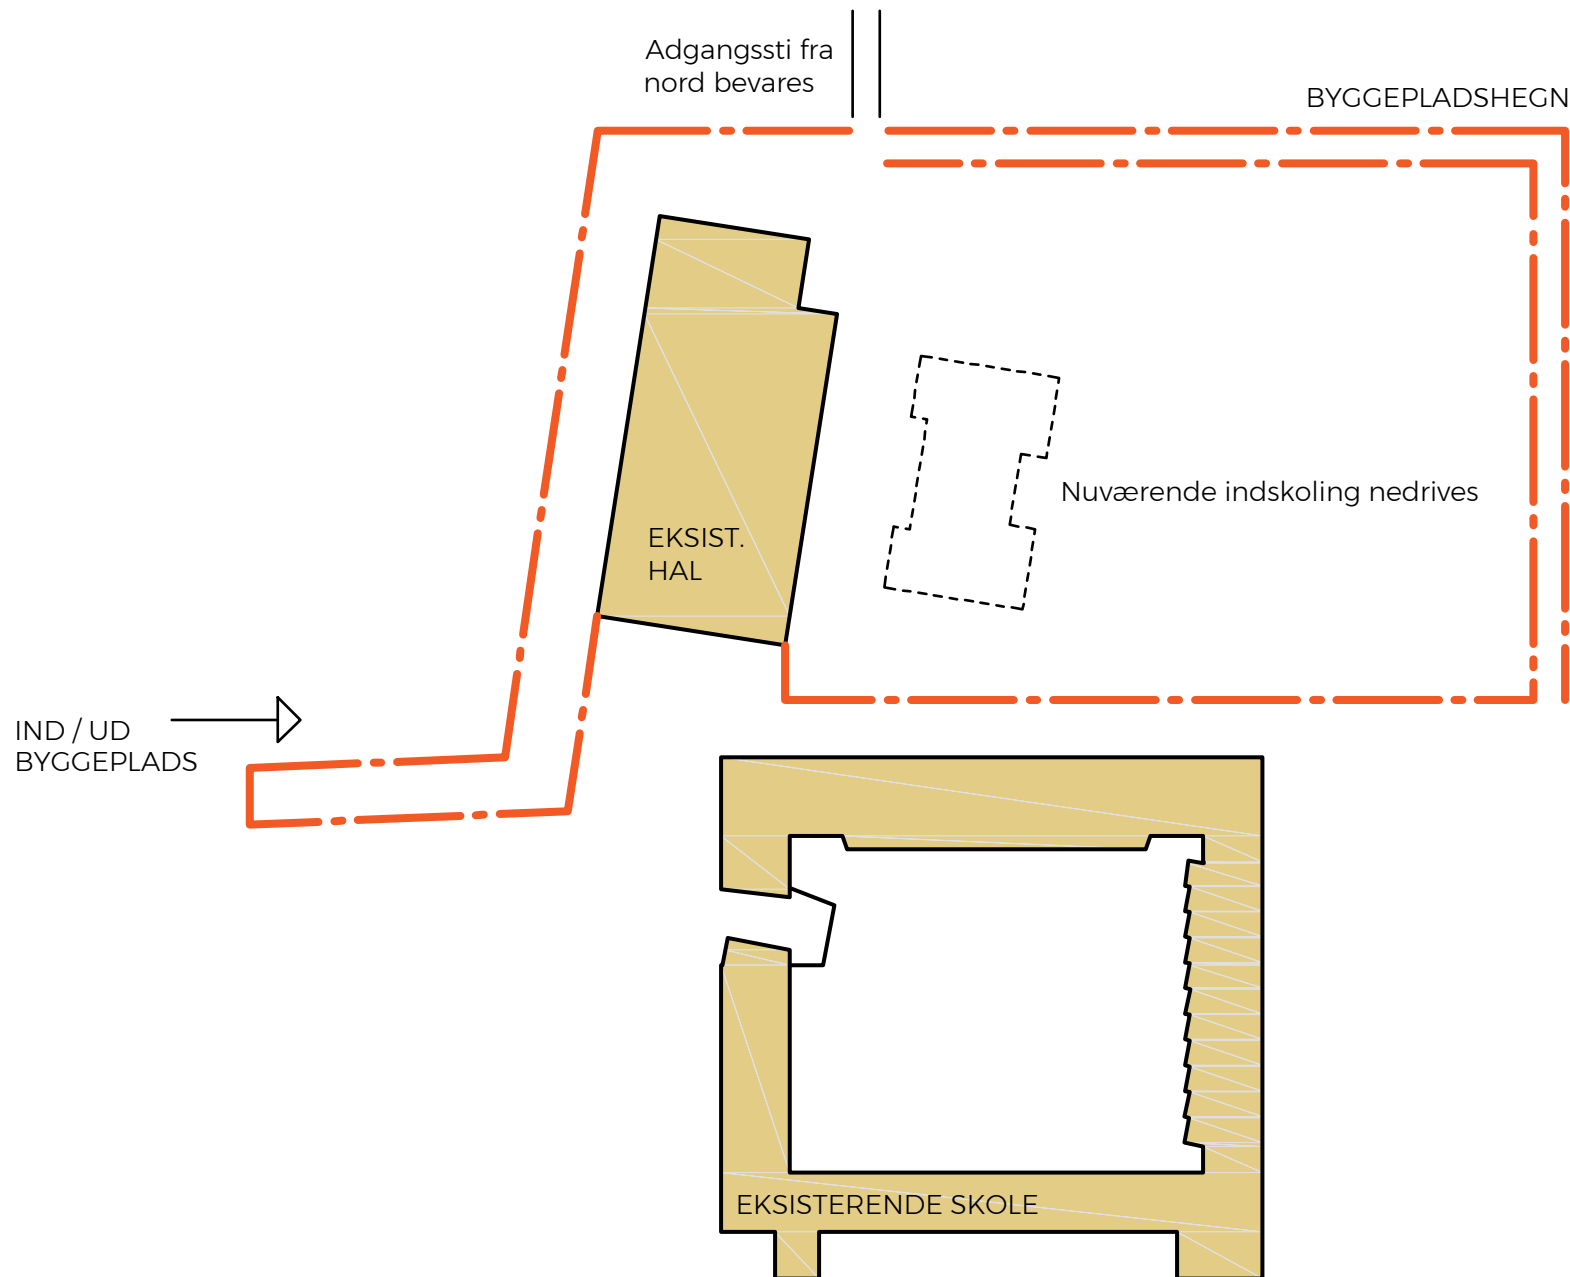

ETAPE 01

JULI - AUGUST 2024


Der etableres byggepladshegn, så skolen og byggepladsen adskilles.

Byggepladshegnet placeres så den eksisterende skole kan fungere uhindret sammen med hal og musiklokaler.

Den eksisterende indskoling nedbrydes og materialer, der kan genanvendes køres i depot.

Legepladsudstyr demonteres ligeledes og køres i depot.


Såfremt det ønskes, kan dele placeres midlertidigt syd for skolen på det grønne areal.

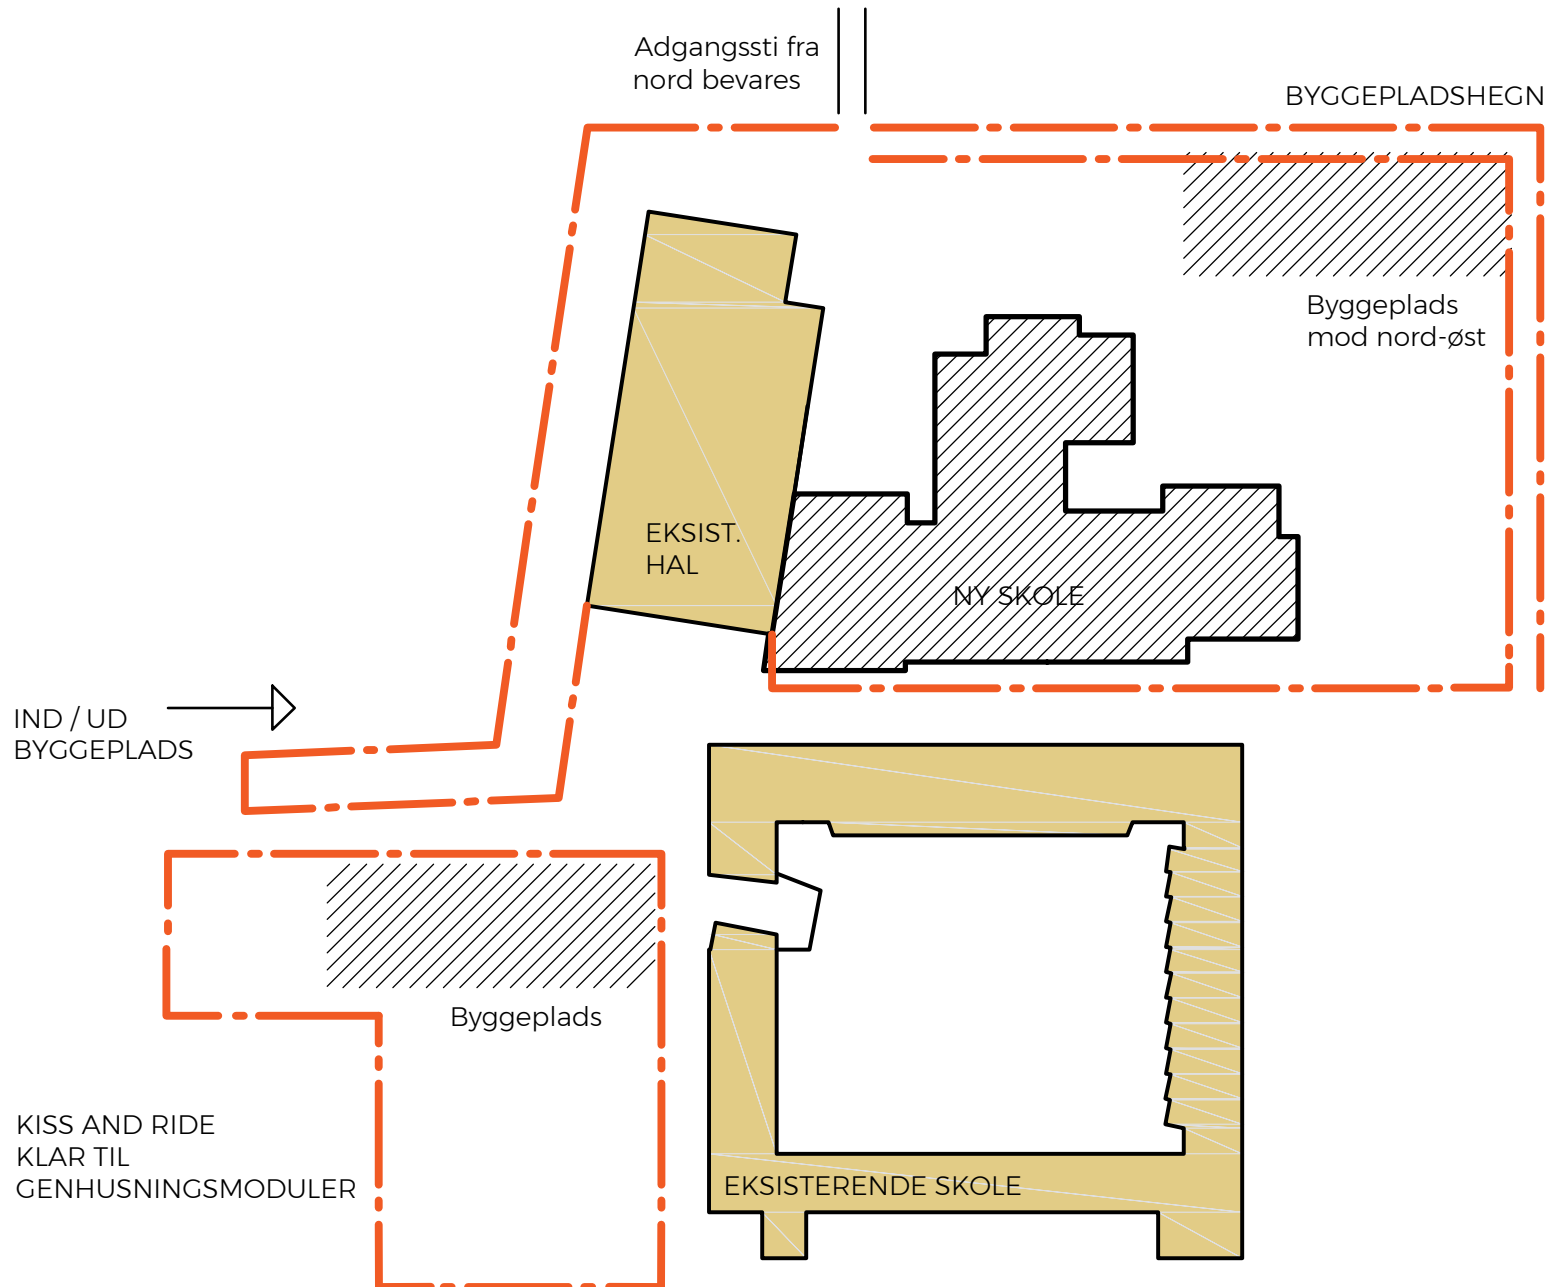

ETAPE 02

**SEPTEMBER -
DECEMBER 2024**

Der etableres byggeplads mod nord.
Jord, kloak og betonarbejder pågår på den del, der ligger nord for den eksisterende skole.

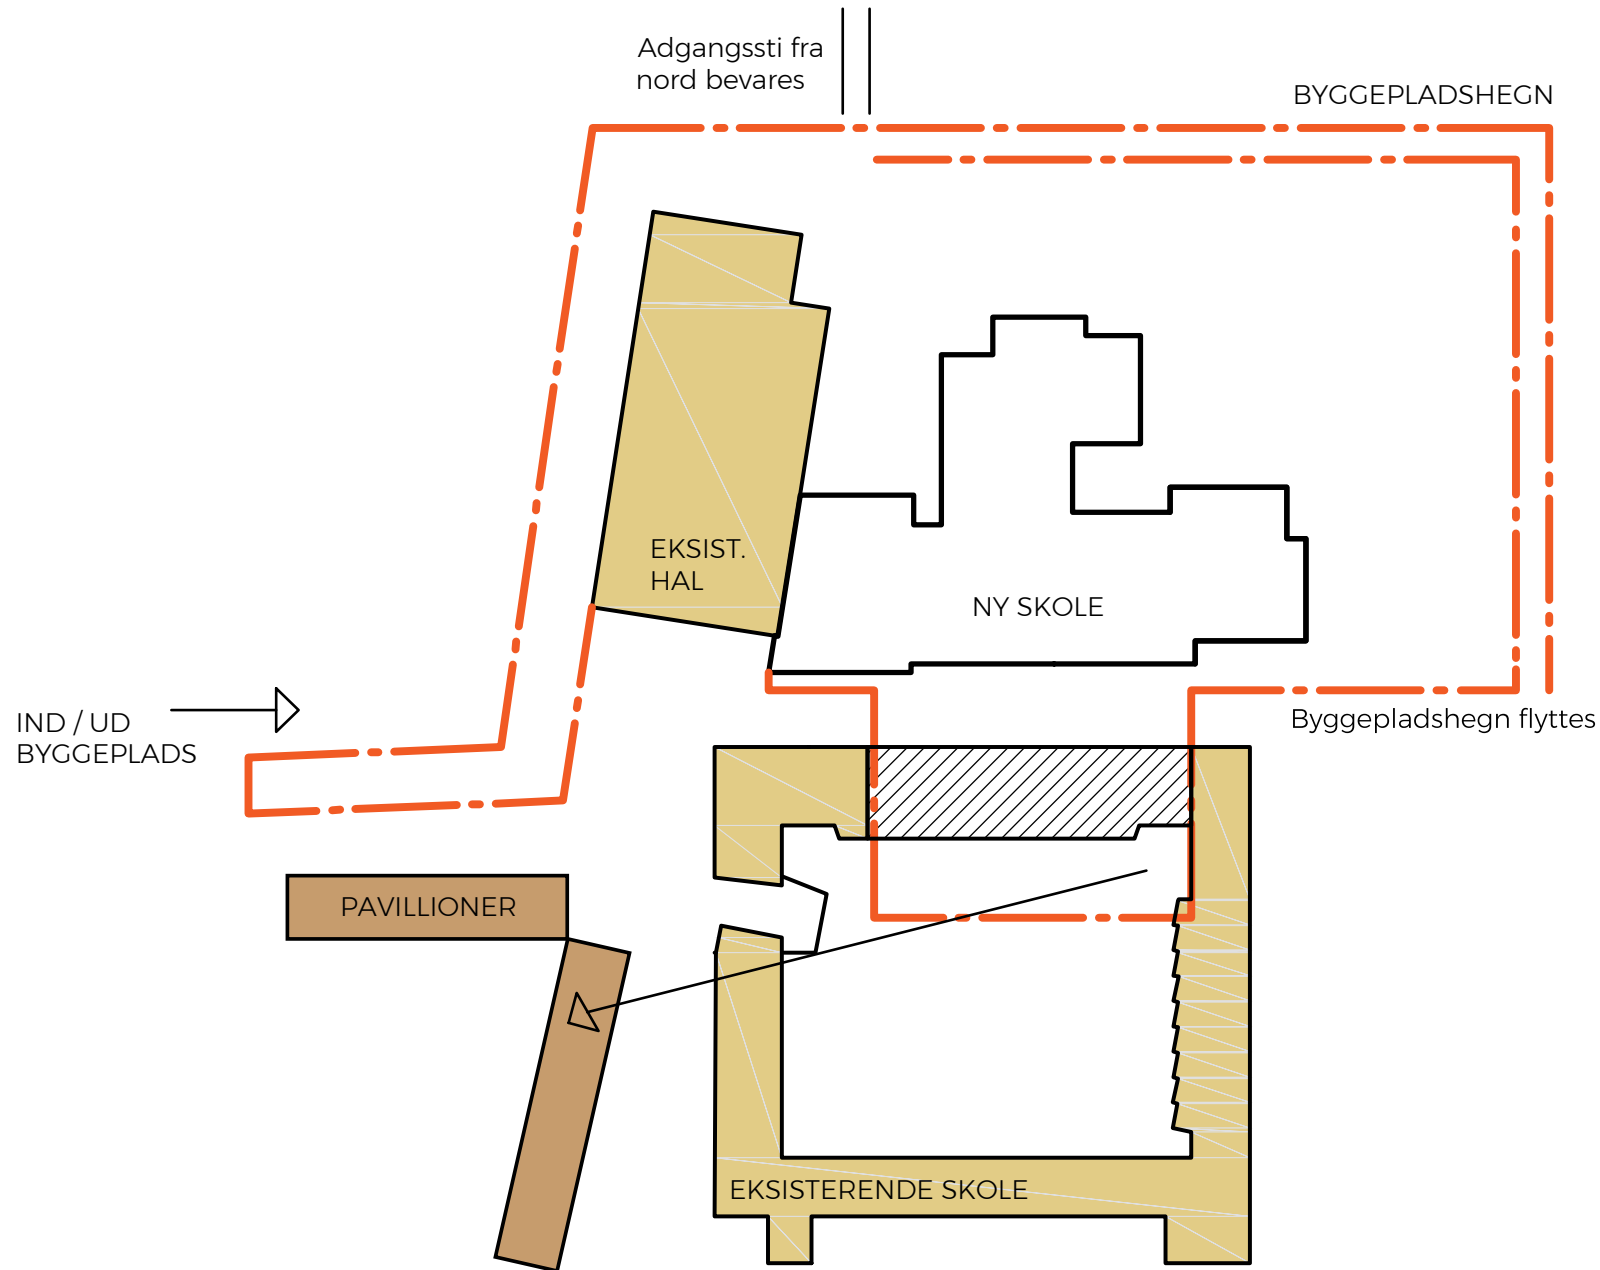


ETAPE 03

JANUAR - FEBRUAR 2025

Der opstilles pavilloner i Julen 2024 til erstatning for den del af den nordlige fløj, der skal nedbrydes.

Byggepladshegn flyttes så skole og byggeplads er adskilt.


Nedbrydning af den midterste del af til eksisterende gavle, så trappe og madkundskab kan bevares mod vest, mens trapperum mod øst fjernes. Her opstilles udvendig flugtvejstrappe.

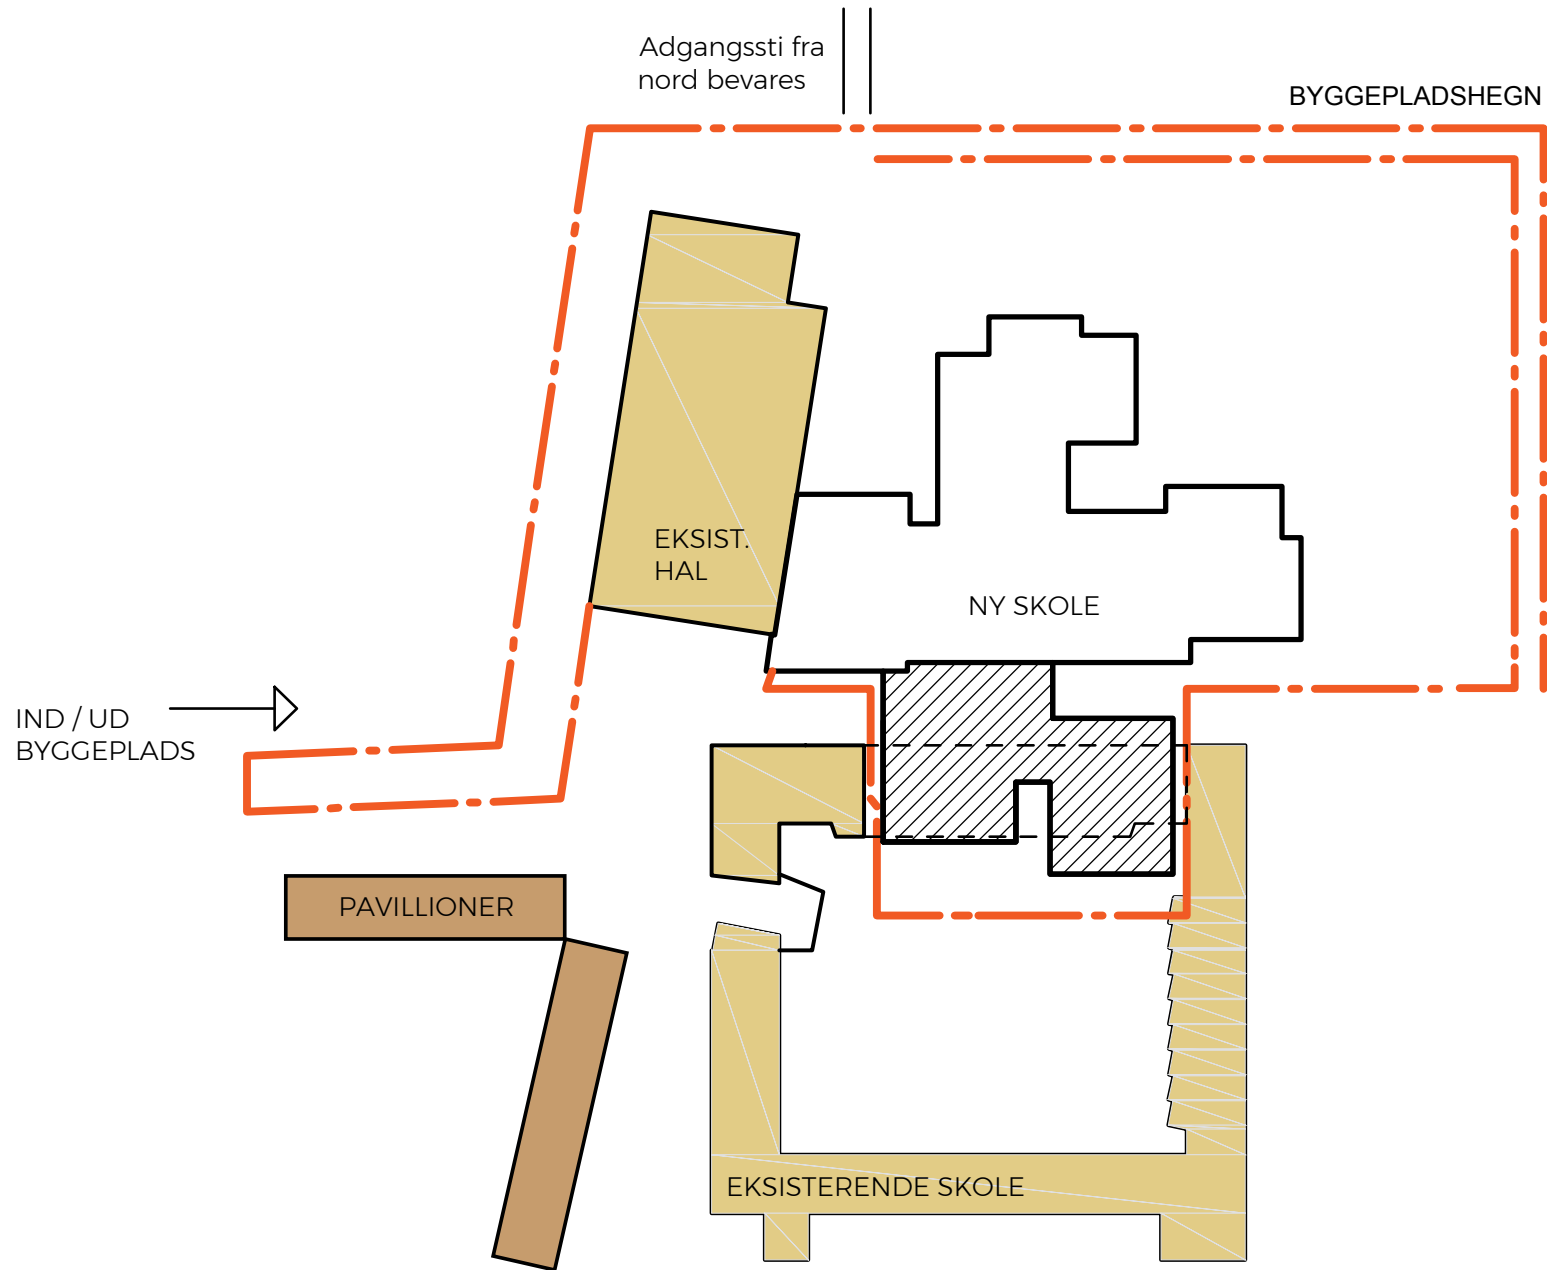

ETAPE 04

**FEBRUAR 2025 -
JULI 2026**

Efterfølgende udføres skolebyggeri over eksisterende kælder, i takt med det øvrige byggeri mod nord.

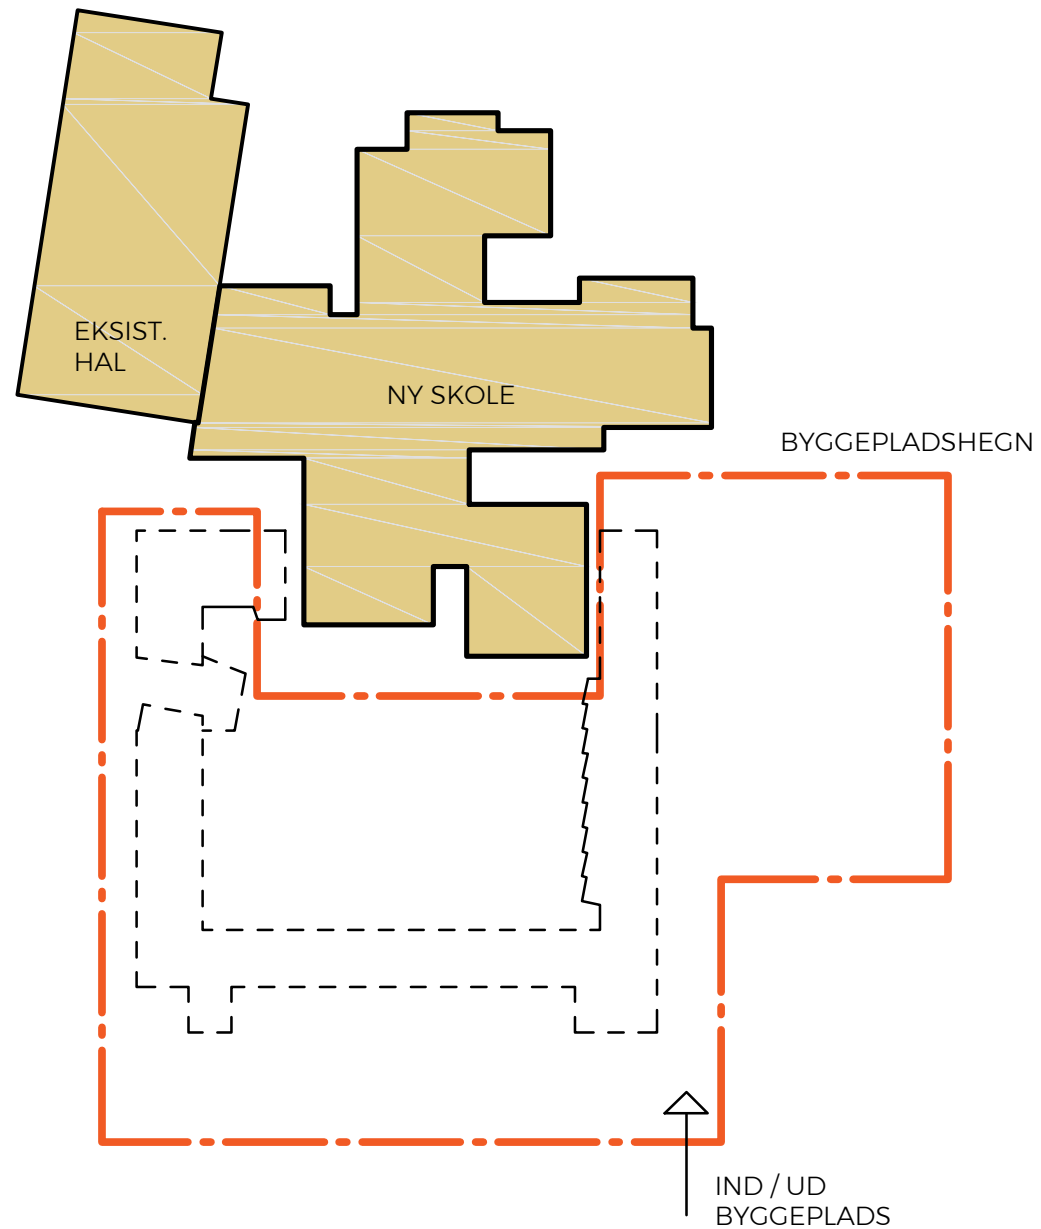

ETAPE 05
**AUGUST 2026 -
JANUAR 2027**

Eksisterende skole nedbrydes og udearealer mod syd færdiggøres.

SITUATIONSPLAN

