

MARINA FOR ALLE

Styregruppemøde d. 3 juni 2025

Rekreative faciliteter ved marinaen



Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse



Medfinansieret af
Den Europæiske Union



Dagsorden for mødet:

1. Velkomst v/Anders Møllegård
2. Status på byggeriet incl. tidsplan v/Kenneth Hermansen
3. Arrangementer på marinaen (incl. Marinaens dag) v/Tina Frisch Karstensen
4. Eventuelt (herunder evt. ny dato for næste møde) v/fælles
5. Rundtur på marinaen v/fælles
6. Tak for i dag v/Anders Møllegård

Arbejder i 2025


Udførelse i 2025:

- Wayfinding: Mangler opsætning af en gruppe skilte
- Udvidelse af strand: Udført – Mangeludbedring pågår
- Stenkastning på molen: Pågår – 95 % færdig
- Byggeri af Sundhus og Molehus – opstart uge 15
- Opførelse af vartegnet: Opstartes i august 2025
- Opholdsarealer på molen: Efterår 2025
- Anlæggelse af skaterbane: Udført
- Havbaderne opfører deres faciliteter på molen – koordineres med øvrige anlægsarbejder



Tidsplan for de resterende arbejder

Tidsplan for de kommende arbejder
Bedste skøn for en tidsplan på nuværende tidspunkt:

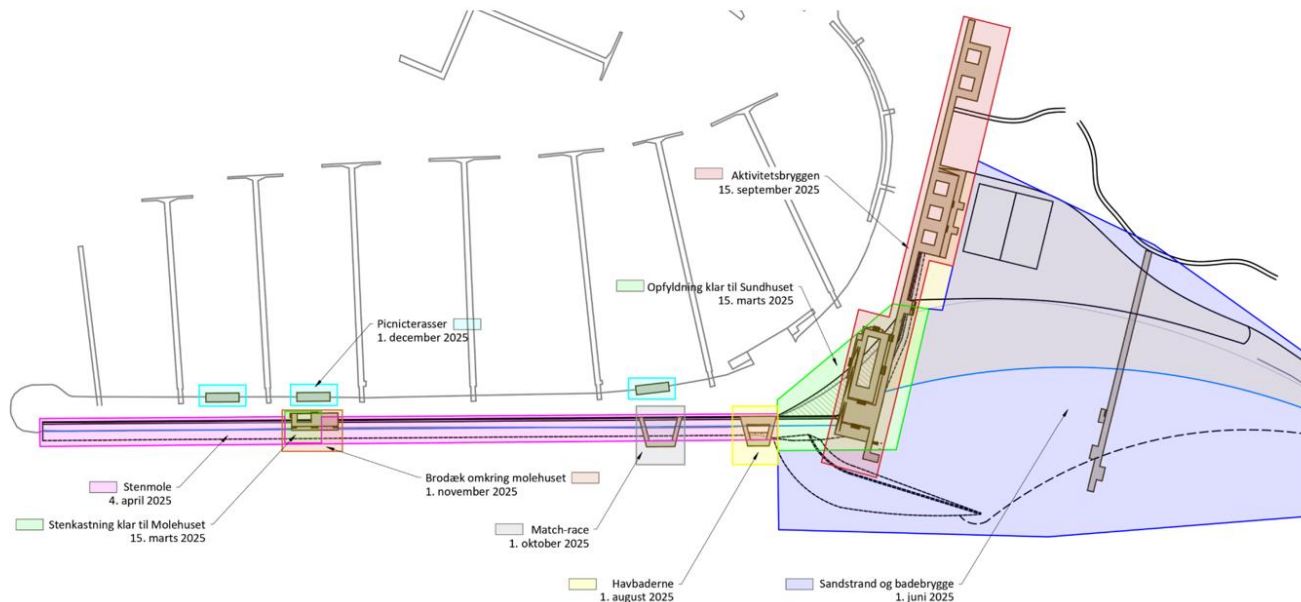

Vartegn på molen

- Placeret for enden af molen
- Fungerer som en signatur for projektet
- Ønsker udkigspost
- Siddepladser
- Formidling





Ydre skal - Træ
Rødmalet som havnekontoret

Ydre skal - Værn
Rustfrit stål

Trappe/siddepladser
Beton

Møbel
Placering som nuværende på kanten af molen

Fundament - Formidlingsplader
Rustfrit stål.
Plader der marsvinets tilhørsforhold til området.

Fundament
Beton i 1 meters højde for at tage højde for vandstandsændringer





Kommende arrangementer på marinaen

- Lørdag d. 24. maj 2025:
Marinaens dag
- Onsdag d. 25 juni 2025:
Rejsegilde på Sundhuset
- Ultimo 2025: Indvielse af hele
projekt "Marina For Alle"



Evt.

Næste møde

Forslag:

XX. MM 2025

Kl. 15:00 – 17:00

Tak for i dag.
