

Bilag 1**Ansøgningsskema – Screening for miljøvurderingspligt**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Glostrup Kommune har med Klimatilpasningsplan 2015 vedtaget en række målsætninger for den fremtidige klimatilpasning og klimasikring i kommunen, herunder især for så vidt angår kloaksystemer. På den baggrund har Glostrup Forsyning fået udarbejdet konkretiseringsplaner, som beskriver de konkrete tiltag der skal udføres for at sikre det vedtagne serviceniveau i hvert enkelt af de 6 delområder, som kommunen er opdelt i. Konkretiseringsplan CDF og Tillæg nr. 7 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2006-2015 beskriver, at der skal anlægges et regnvandsbassin ved Christiansvej. Nærværende vvm-ansøgningsskema omhandler Glostrup Forsynings projekt for etablering af et nedgravet regnvandsbassin med en volumen på 7.300 m³. Når regnvandsbassinet er etableret, vil Glostrup Kommune gennemføre et vejprojekt, samt etablere en ny legeplads for daginstitutionen på Eriksvej 22. Arealet omkring bassinet er desuden udbudt til salg for byggeri af en etageboligejendom samt eventuelt et parkeringshus. Disse projekter, samt forberedende arbejder for disse, er ikke en del af Glostrup Forsynings bassinprojekt. I bassinprojektet etableres der et nedgravet opsamlingsbassin under det område, der i dag fungerer som parkeringsplads. Bassinet består af en langsgående betonkanal, der står i forbindelse med en række store GAP-rør (glasfiberarmeret polyester). 3D-tegning af bassinanlægget er vedlagt som bilag. I tilknytning til selve bassinet foretages der en række omlægninger af det eksisterende afløbssystem: - En ny regnvandsledning anlægges i Eriksvej fra Hovedvejen til Christianvej og videre til Søndre Ringvej. Ledningen har overløb til det planlagte regnvandsbassin på Christiansvej. - Den eksisterende fællesledning og regnvandsledning i Christiansvej nedlægges og erstattes af en ny spildevandsledning og en regnvandsledning i større dimension. - Over bassinet etableres en driftsvej, der belægges med stabilgrus. - Fra bassinet etableres en ledning mod øst til Sdr. Ringvej, samt en pumpestation. Herfra pumpes regnvandet til fællesledning i Sdr. Ringvej og videre til Spildevandscenter Avedøre, sådan som det også er tilfældet i dag.	Ingen bemærkninger.

		For at sikre mod opdrift, vil bassinanlægget bliver anlagt med et drænsystem. Bassinanlægget er vist på kortbilaget.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup 43 20 80 20 forsyning@glostrupforsyning.dk	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Kristian Schou 43 20 80 51 ks@glostrupforsyning.dk	-
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Anlægget etableres på de nuværende matr. nr. 7000bg og 7000ab, Glostrup By, Glostrup. Under anlægsarbejdet vil matr. nr. 6ev, Glostrup By, Glostrup desuden blive benyttet som arbejdsplads.	Arbejdet foregår i offentligt vejareal
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Glostrup Kommune.	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Oversigtskort er indsat som bilag sidst i dokumentet.	Se bilag
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:2.000	Kortbilag ligger som særskilt bilag.	Se bilag

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Myndighedens bemærkninger
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Glostrup Kommune ejer de pågældende arealer. Der er indgået aftale med Glostrup Kommune om benyttelse af arealerne.	Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	I forbindelse med projektet vil dele af den nuværende parkeringsplads på matr.nr. 7000bg bliver brudt op. Regnvandsbassinet anlægges med en driftsvej på ca. 235 m ² . De øvrige arealer over bassinet afleveres med råjord til grundejers disposition indenfor rammerne af de aftaler, der er indgået. Bassinprojektet vil således ikke medføre nye befæstede eller bebyggede arealer.	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Det forventes ikke, at der skal udføres grundvandssænkning ifm. anlægsarbejdet. Der kan dog være behov for sænkning af det sekundære grundvandsspejl (maksimalt 1/2 m) i forbindelse anlægsarbejdet, især ved udgravninger til ventilbrønd og pumpestation. Som følge af jordens tæthed forventes det, at disse udgravninger kan tørholdes ved almindelig lænsepumpning. Tørholdelse af udgravninger vil være midlertidig. Oppumpet vand vil blive rensat i en sedimentationscontainer inden det ledes ud til det eksisterende kloaksystem. I tilfælde af at det sekundære grundvand er forurenat over afledningskriterierne vil det blive rensat i et kulfilter. For at sikre det færdige bassinanlæg mod opdrift, bliver der anlagt et drænsystem omkring anlægget. Drænsystemet kan sammenlignes med et omfangs- og fundamentdræn. Drænpumpen starter hvis det sekundære grundvandsspejl når kote 10,15 m og pumpen stopper igen ved kote 9,25 m. Terrænet ligger i dag omkring kote 13,8 m. Alle koter er i DVR90. Over hele året forventes det, at det sekundære vandspejl varierer fra +8,9 til +12,0 m DVR90. Estimerterne tager udgangspunkt i, at drænene i gennemsnit over året ligger 1,0 m under det sekundære vandspejl. Dette inkluderer perioder, hvor der intet vand løber til drænene, samt våde perioder. I driftsfasen vil der i tørre perioder ikke bliver pumpet drænvand fra drænsystemerne, da det sekundære vandspejl ligger under drænniveau. Den maksimale vandmængde vil komme i forbindelse med våde perioder, hvor grundvandsspejlet står højt og kraftige regnhændelser i medfører en opfyldning af det sekundære grundvandsmagasin. Her forventes bortledningen fra drænsystemet at udgøre op til 30 l/s, svarende til en total udledning på 54 m³ i tiden efter en regnhændelse. Set over året forventes en gennemsnitlig udledt vandmængde på 0,15 l/s, svarende til ca. 4.700 m³/år. I anlægsfasen forventes de samme vandmængder som ovenfor anført.	Der skal søges om midlertidig tilslutningstilladelse for anlægsarbejdet. Der skal søges om permanent tilslutningstilladelse for det endelige projekt
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ikke relevant, idet bassinet (knap 3.500 m ²) etableres under terræn.	Ingen bemærkninger.

Projektets bebyggede areal i m²	Ikke relevant				-																																								
Projektets nye befæstede areal i m²	Ikke relevant				-																																								
Projektets samlede bygningsmasse i m³	Ikke relevant				-																																								
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ikke relevant				-																																								
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	I forbindelse med anlægsarbejdet skal der etableres arbejdsplads/skurby på matr. nr. 6ev, Glostrup by, Glostrup. Alle bygninger på grunden (bygning 2, 3, 4, 5 og 7) nedrives og arealet ryddes inden projektet påbegyndes. Der etableres desuden en midlertidig p-plads på matr. nr. 7eø, Glostrup by, Glostrup. Alle bygninger på grunden nedrives og arealet ryddes, hvorefter der etableres en p-plads af midlertidig karakter. I skemaet nedenfor vises en oversigt, over de bygninger, der nedrives. <table><tr><th>Matr.nr.</th><th>Adresse</th><th>Bygning</th><th>Bebygget areal</th><th>Anvendelse</th></tr><tr><td>6ev</td><td>Eriksvej 9</td><td>2</td><td>40 m²</td><td>Klubhus ifm. fritid og idræt</td></tr><tr><td>6ev</td><td>Eriksvej 9</td><td>3</td><td>42 m²</td><td>Anden bygning til fritidsformål</td></tr><tr><td>6ev</td><td>Eriksvej 9</td><td>4</td><td>8 m²</td><td>Anden bygning til fritidsformål</td></tr><tr><td>6ev</td><td>Eriksvej 9</td><td>5</td><td>134 m²</td><td>Carport</td></tr><tr><td>6ev</td><td>Eriksvej 9</td><td>7</td><td>22 m²</td><td>Udhus</td></tr><tr><td>7eø</td><td>Sydvestvej 42</td><td>1</td><td>83 m²</td><td>Anden bygning til sundhedsformål</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>329 m²</td><td></td></tr></table> De to ovennævnte matrikler skal senere benyttes til hhv. etageboligbyggeri og parkeringshus, som ikke en del af bassinprojektet.				Matr.nr.	Adresse	Bygning	Bebygget areal	Anvendelse	6ev	Eriksvej 9	2	40 m²	Klubhus ifm. fritid og idræt	6ev	Eriksvej 9	3	42 m²	Anden bygning til fritidsformål	6ev	Eriksvej 9	4	8 m²	Anden bygning til fritidsformål	6ev	Eriksvej 9	5	134 m²	Carport	6ev	Eriksvej 9	7	22 m²	Udhus	7eø	Sydvestvej 42	1	83 m²	Anden bygning til sundhedsformål	Total			329 m²		Ingen bemærkninger.
Matr.nr.	Adresse	Bygning	Bebygget areal	Anvendelse																																									
6ev	Eriksvej 9	2	40 m²	Klubhus ifm. fritid og idræt																																									
6ev	Eriksvej 9	3	42 m²	Anden bygning til fritidsformål																																									
6ev	Eriksvej 9	4	8 m²	Anden bygning til fritidsformål																																									
6ev	Eriksvej 9	5	134 m²	Carport																																									
6ev	Eriksvej 9	7	22 m²	Udhus																																									
7eø	Sydvestvej 42	1	83 m²	Anden bygning til sundhedsformål																																									
Total			329 m²																																										
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden																																													

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Det anslåede forbrug af råmaterialer i anlægsperioden er: <table><tr><th>Type materiale</th><th>Ton</th></tr><tr><td>GAP-rør og elementer</td><td>1.160</td></tr><tr><td>Polypropylen rør</td><td>5</td></tr><tr><td>Beton</td><td>350</td></tr><tr><td>Jern og stål</td><td>700</td></tr><tr><td>Fiberdug</td><td>2</td></tr><tr><td>Geonet</td><td>2</td></tr><tr><td>Perlesten</td><td>2.760</td></tr><tr><td>Drænsand</td><td>3.600</td></tr><tr><td>Råjord</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Muldjord</td><td>1.100</td></tr><tr><td>Sand / støttelag 0-32</td><td>1.740</td></tr></table> Størstedelen af bassinet er planlagt udført i GAP-rør i stedet for beton, for at spare på betonforbruget og dermed reducere CO₂-aftrykket. Der planlægges ikke at stille krav om benyttelse af genbrugsmateriale. For flere af typerne vil dette dog være en mulighed for leverandørerne, så længe materialerne overholder de fastsatte krav.	Type materiale	Ton	GAP-rør og elementer	1.160	Polypropylen rør	5	Beton	350	Jern og stål	700	Fiberdug	2	Geonet	2	Perlesten	2.760	Drænsand	3.600	Råjord	5.000	Muldjord	1.100	Sand / støttelag 0-32	1.740	Ingen bemærkninger.
Type materiale	Ton																									
GAP-rør og elementer	1.160																									
Polypropylen rør	5																									
Beton	350																									
Jern og stål	700																									
Fiberdug	2																									
Geonet	2																									
Perlesten	2.760																									
Drænsand	3.600																									
Råjord	5.000																									
Muldjord	1.100																									
Sand / støttelag 0-32	1.740																									
Vandmængde i anlægsperioden	I anlægsperioden vil der blive anvendt drikkevand til sanitære faciliteter for mandskabet. I forbindelse med spuling af spildevandstekniske anlæg vil der blive anvendt begrænsede mængder (ca. 30 m³) genbrugsvand. Spuling sker fra spulevogne, der typisk henter teknisk vand fra renseanlæg (renset spildevand). Efter spuling bliver vandet opsamlet og filtreret og opsamlet i spulevognen.	Ingen bemærkninger.																								
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Før etablering af bassinet skal dele af den eksisterende parkeringsplads fjernes. Under anlægsarbejdet skal der udgraves jord med gravemaskine. Der skal desuden bores jordankre og udføres spunsning med rammemaskine. Fjernelse af parkeringsplads vil medføre bortskaffelse af ca. 2.200 tons asfalt og 50 ton kantsten. Arealet over bassinet afleveres uden asfalt. Asfalten bortskaffes efter gældende regler. Brugt asfalt bliver typisk solgt til genbrug, men dette ligger udenfor nærværende projekt. Kantsten køres til Glostrup Kommunes materialeplads mhp. senere brug. Under udgravningen vil der blive flyttet ca. 15.000 m³ jord - ca. 800 m³ pr. dag svarende til 45 læs pr. dag. Desuden nedlægges eller udskiftes brønde og ledninger ifm. projektet. Disse ledningsanlæg vil blive bortskaffet eller afblændet. Selve bassinanlægget fortrænger ca. 8.000 m³ jord. Derudover er der krav om at der omkring bassinet indbygges drænsand. Samlet set betyder det, at 11-12.000 m³ jord skal køres væk, mens ca. 3-4.000 m³ jord potentielt kan genindbygges, hvis det er egnet til formålet. Dette vurderes i forbindelse med anlægsprojektet.	Ingen bemærkninger.																								

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil blive afledt sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter, samt evt. vand fra lænsepumper.	Der skal søges om midlertidig tilslutningstilladelse for anlægsarbejdet.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ikke relevant. Anlægsprojektet indebærer ikke direkte udledning af spildevand til vandområder.	Ingen bemærkninger.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand vil primært blive ledt uden om udgravningerne til eksisterende systemer. Det regnvand, der måtte løbe ned i graveområdet, vil blive lænset herfra. Regnvand afledes til eksisterende fællessystem, som leder til BIOFOS' Spildevandscenter Avedøre (SCA).	Der skal søges om midlertidig tilslutningstilladelse for anlægsarbejdet.
Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå	04/2025 – 11/2026	-

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke være produktion af råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vandforbrug i driftsfasen.	Ingen bemærkninger.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Bassinet spules ca. hvert 5. år, hvor der opsamles sand, som bortskaffes efter gældende regler.	Ingen bemærkninger.
Farligt affald:	Ikke relevant	-
Andet affald:	Sand fra spuling, skønnet under 5 m ³ pr. spuling.	Ingen bemærkninger.
Spildevand til renseanlæg:	Regnvandet vil som i dag blive ledt til fælleskloak og derefter til Spildevandscenter Avedøre. Det samme gælder vand fra lænsepumper.	Der skal søges om permanent tilslutningstilladelse for det endelige projekt
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der udledes ikke spildevand direkte til recipient idet vandet ledes til spildevandscenter Avedøre.	Ingen bemærkninger.
Håndtering af regnvand:	Projektet medfører ikke i sig selv ændringer af håndtering af overfladevand fra arealerne over projektområdet. Bassinet anlægges for at forsinke regnvandet og forøge kapaciteten af regnvandssystemet i oplandet til bassinet, og dermed reducere risikoen for opstuvning af vand på terræn. Dette beskrives i ansøgning om tilslutningstilladelse.	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Anlægsarbejdet er omfattet af Glostrup Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Heri er det fastsat at støjende og vibrerende aktiviteter, f.eks. nedramning af spuns, kun må foregå inden for tidsrummene: Hverdage kl. 07:00-18:00 Lørdage kl. 07:00-14:00 Hvis der skal udføres støjende arbejde uden for disse tidsrum, skal der søges dispensation.	Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægsarbejde vil kun foregå inden for normal arbejdstid, og vil overholde Glostrup Kommunes grænseværdier og arbejdstider for støjende aktiviteter. Nedramning af spuns vil være den mest støjende aktivitet. Dette arbejde forventes at ville tage i alt ca. 25 arbejdsdage.	Vi anbefaler orientering af naboer forud for særligt støjende aktiviteter, også inden for normal arbejdstid.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Projektet vil ikke medføre støj eller vibrationspåvirkninger i driftsfasen.	Ingen bemærkninger.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Nej, projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Anlægsarbejderne vurderes ikke at omfatte aktiviteter, der vil medføre luftforurening. Der anvendes almindelige typer af anlægsmaskiner. Anlægsarbejdet kan ifm. jordarbejder medføre støv i tørre perioder, som dog kan afhjælpes med vanding, og som dermed ikke vurderes at ville påvirke omgivelserne væsentligt.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i driftsfasen af bassinet.	Ingen bemærkninger.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Anlægsarbejdet i forbindelse med gravning kan medføre støv i tørre perioder, men det forventes ikke at påvirke omgivelserne, da projektet vil begrænse støvudvikling så meget som muligt. Anlægsarbejdet er omfattet af Glostrup Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge og -anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Heri er det fastsat at støvende aktiviteter kun må foregå inden for tidsrummene: Hverdage kl. 07:00-18:00 Lørdage kl. 07:00-14:00 Hvis der skal udføres støvende arbejde uden for disse tidsrum, skal der søges dispensation. Der vil ikke være støvende aktiviteter ifm. driftsfasen.	Ingen bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil ikke være lugtgener i anlægs- eller driftsfasen af regnvandsbassinet og -ledninger.	Ingen bemærkninger.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Det færdige anlæg har ikke behov for belysning. Anlægsperioden vil skurbyen/arbejdspladsen være belyst i aften- og nattetimer.	Belysning i anlægsperioden må ikke være til gene for naboer
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, der skal ikke anvendes farlige stoffer.	Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Den eksisterende lokalplan GL35.3 formål er blandt andet "at fastlægge krav til forsinkelse af afledt nedbør fra lokalplanområdet for derved at reducere det generelle pres på kloaksystemet." Projektet kan rummes inden for den eksisterende lokalplans bestemmelser under punkt 9. Her står blandt andet "Tagvand samt vand fra belagte arealer skal forsinkes i faskiner, rør, bassiner eller forsænkninger og bede i terræn på den enkelte ejendom." "I det fælleskloakerede system skal forsinkelsesfaciliteter til ophold af afledt regnvand dimensioneres til at kunne rumme nedbør fra en 10 års regnhændelse. Disse krav er fastlagt for at klimatilpasse afledningssystemerne." Det vurderes at projektet kan rummes inden for den eksisterende lokalplans bestemmelser og formål. Der er pt. en ny lokalplan under udarbejdelse. I forbindelse med rydningen af matr. nr. 7ev, vil der blive fjernet træer og bevoksning, som i henhold til den nuværende lokalplans § 8.2 er bevaringsværdig. Fjernelsen af de pågældende træer og bevoksning forventes ikke at være i strid med den kommende lokalplan, og vil først blive fjernet såfremt dette er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.	Projektet strider ikke mod den eksisterende lokalplan, bortset fra de nævnte træer mm. Der er ved at blive udarbejdet to nye lokalplaner for området, hvor bassinet placeres – GL 60 for hovedparten af bassinet samt GL35.5 for daginstitutionen Regnbuen, der gælder for den vestligste bid af bassinet. Begge nye lokalplaner omfatter træer og beplantning. Projektet arbejder for opfyldelse af de kommende lokalplaner. Forslag til lokalplan er pt. på vej gennem politisk proces. De sendes i høring i november og december 2024, og forventes endelig vedtaget i løbet af foråret 2025. Fjernelse af træer og beplantning skal afvente de nye lokalplaner.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nærmeste bygge- eller beskyttelseslinje er skovbyggelinjen, der ligger 1,5 km fra projektområdet.	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet vil ikke medføre begrænsning af arealer uden for projektområdet på matriklerne 6ev, 7000bg og 7000ab Glostrup By, Glostrup.	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er ingen råstofområder i eller nær projektområdet.	Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej.	Ingen bemærkninger.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej, der er ikke skov inden for projektområdet.	Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej, der er ingen fredninger eller fredningssager i eller nær projektområdet.	Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			500 m sydvest for ligger en § 3-beskyttet sø. Den vurderes ikke at blive påvirket af projektet.	Ingen bemærkninger.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er 2,5 km til nærmest registrerede bilag IV arter. Der er ca. 1 km til nærmest registrerede fredede art. Projektet vurderes ikke at have påvirkning på beskyttede eller fredede arter.	Ingen bemærkninger.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 2,5 km til det fredede område (Vestvolden).	Ingen bemærkninger.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 7,5 km til Natura 2000-området Vasby Mose og Sengeløse Mose.	Ingen bemærkninger.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej, regnvandet der forsinkes i bassinet udledes til kloak. Der er ingen vandområder i eller nær projektområdet. Projektet vurderes i driftsperioden ikke at påvirke overfladevand, vandområder eller grundvandet.	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser.	Projektområdet ligger inden for indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning. Vi vurderer ikke, at projektet udgør en risiko for grund- eller drikkevand.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej. I nærtliggende områder er der følgende arealer med kortlagt jordforurening: - Nordøst for det kommende bassin er der et V2-kortlagt areal (renseri). - Vest for den nordlige del af Eriksvej er der et V2-kortlagt areal (autoværksted). Syd for Sydvestvej er der endvidere et V1-kortlagt areal. Jordhåndteringsplanen sikrer, at forurenet jord håndteres korrekt, og at jordforurening ikke spredes.	Enig. Jordhåndteringsplan skal godkendes af myndighederne inden gravearbejde påbegyndes
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Nej. Der er risikoområder 1 km vest for projektområdet. Projektet vurderes at mindske risikoen for oversvømmelse i nærområdet.	Ingen bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej.	Ingen bemærkninger.

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Regnvandsbassinet er en del af en større regnvandshåndteringsstrategi for området ifm. klimatilpasning og byfornyelse. Der skal etableres et nyt regnvandsmagasin ved Bane-gårdspladsen. Ved Rådhusparken skal der etableres et underjordisk bassin på 1.100 m³ til håndtering og forsinkelse af fællesvand fra hovedvejen. Tidsplanen for disse to projekter er endnu ikke fastlagt. Der kan være sammenfald mellem anlægsperioderne. Det vurderes at udbygningen af regnvandsbassiner flere steder i Glostrup, som del af et større klimatilpasningsprojekt, vil have positiv indvirkning på miljøet, da der sjældnere vil ske oversvømmelser grundet store regnmængder. Der vil i forbindelse med omkringliggende projekter være anlægsarbejder som særskilt screenes for påvirkning på miljøet. Klimatilpasningsprojektet udføres forud for et større by-udviklingsprojekt af Glostrup bymidte. Byudviklingen er beskrevet i helhedsplanen Knudepunkt Glostrup. Når regnvandsbassinet er etableret, vil Glostrup Kommune gennemføre et vejprojekt, samt etablere en ny legeplads for daginstitutionen på Eriksvej 22. Arealet omkring bassinet er desuden udbudt til salg for byggeri af en etageboligejendom samt eventuelt et parkeringshus (på matr. nr. 7eø, Glostrup by, Glostrup). Disse projekter, samt forberedende arbejder for disse – herunder rydning af de pågældende arealer, er ikke en del af Glostrup Forsynings bassinprojekt.	Ingen bemærkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				-

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 12-11-2024

Bygherre/anmelder:

Myndighedens sagsbehandler har gennemgået skemaet med



Dato: 21-11-2024

Sagsbehandler:

Tina Rømer


Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndigheden gennemgår bygherrens oplysninger om projektet og dets miljøpåvirkning, og indsætter bemærkninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt for vurdering af projektet.

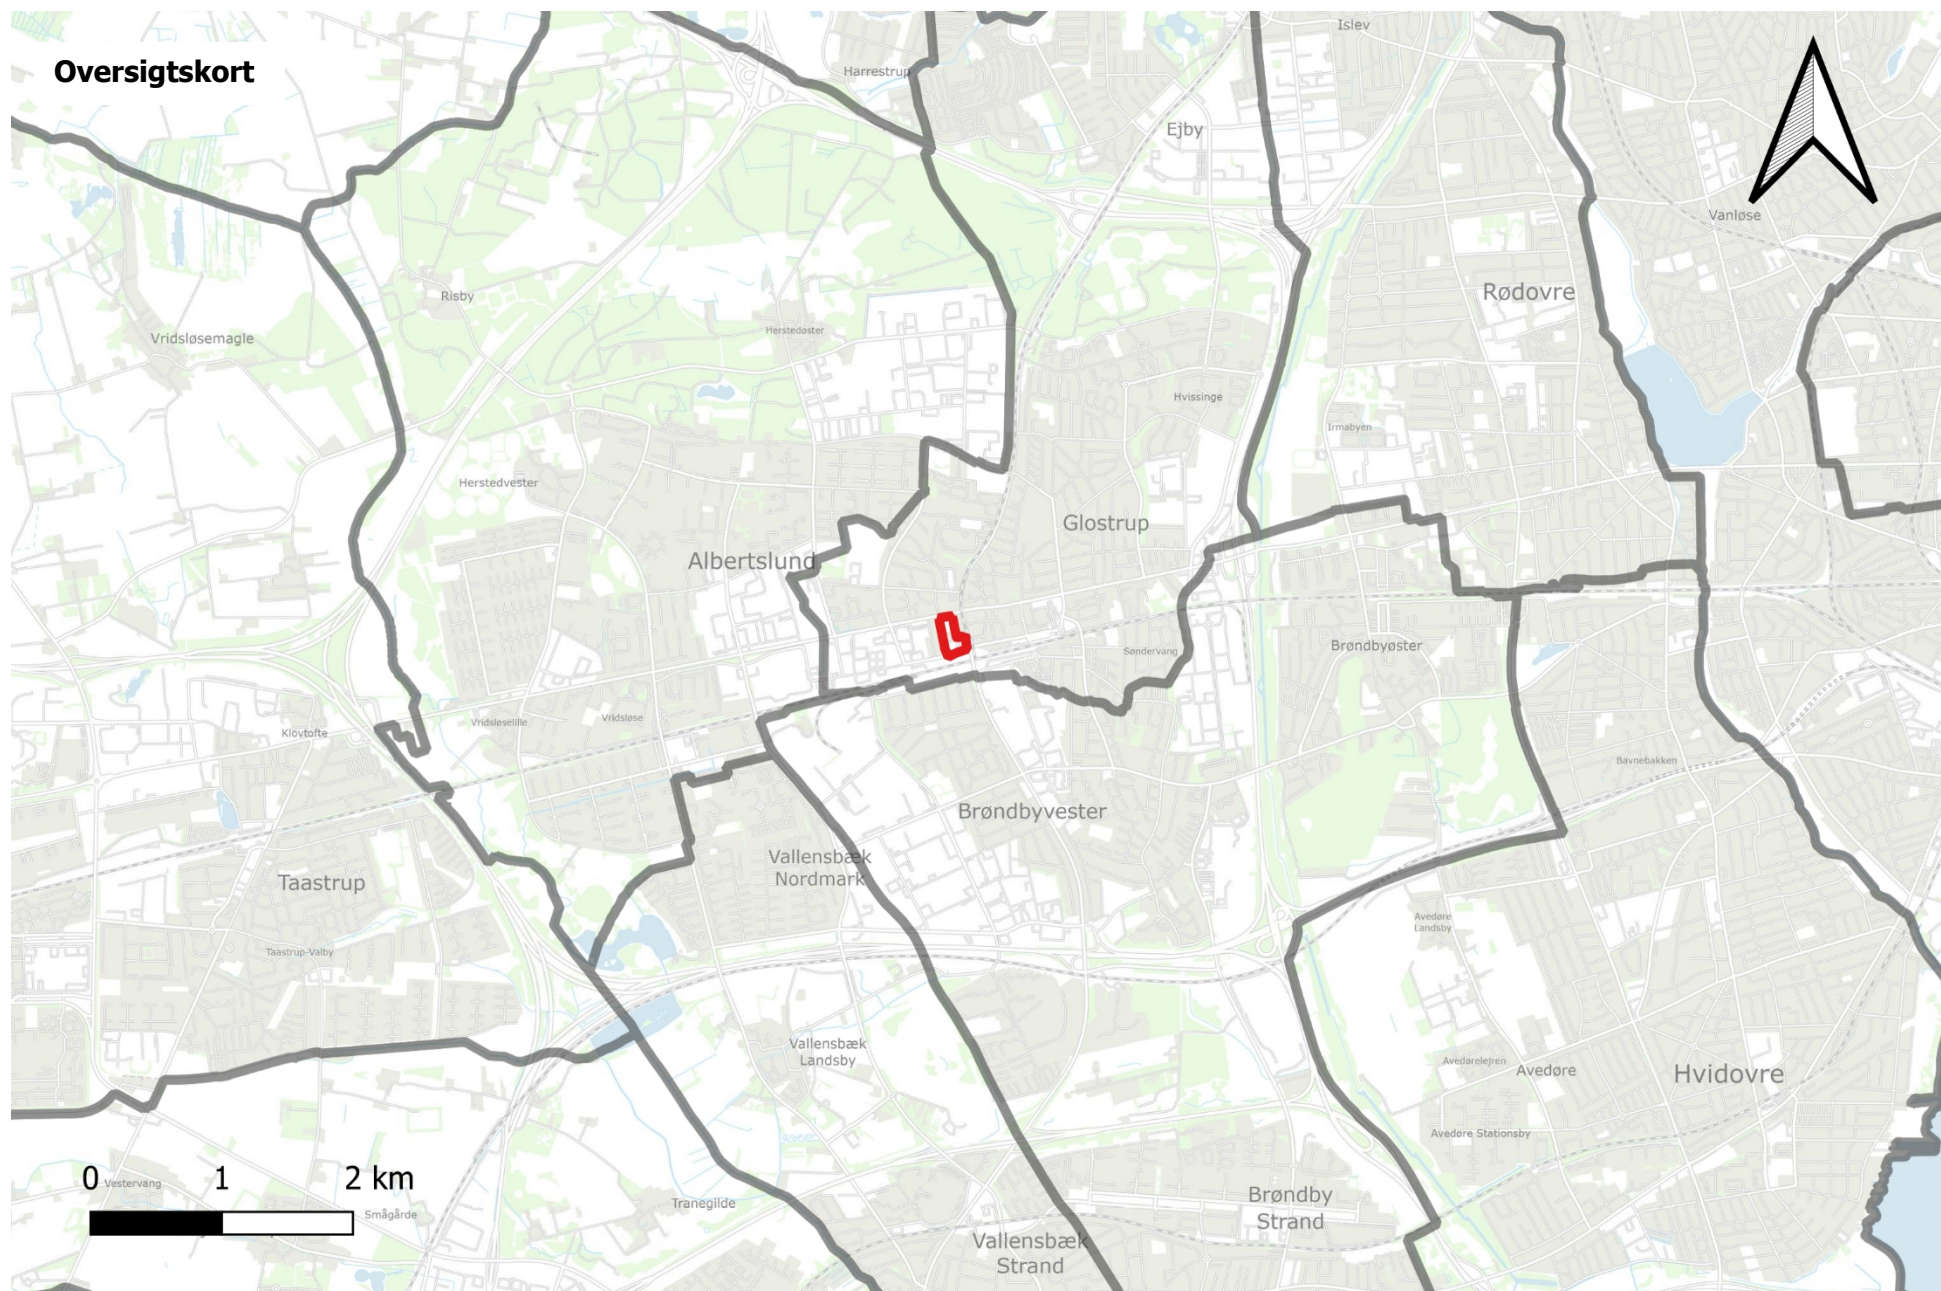

Bilag til projektbeskrivelse - 3D-tegning

