

Halsnæs Kommune
3300 Frederiksværk
Loujj@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Tilsynsrapport

Kommune	Halsnæs Kommune
Sags id.	13.02.00-K08-5-24
Vandværk	Ølsted Strands Vandværk
Jupiter id	83259
Tilsynsdato	5. juni 2024
Repræsentant vandværket	Peter Jeppesen (formand) Christian Riis (bestyrelsesmedlem) Bo Ebling (kasserer)

Tilsynsførende	Louise Just Johansen
----------------	----------------------

Skema 1 – Stamdata

Bemærkninger	Ja: ☐ Nej: ☒
--------------	---

Skema 2 – Baggrundsdata

Bemærkninger	Ja: ☒ Nej: ☐
--------------	---

Skema 3 – Produktion

Bemærkninger	Ja: ☐ Nej: ☒
--------------	---

Skema 4 – Distribution

Bemærkninger	Ja: ☐ Nej: ☒
--------------	---

Skema 5 – Indvinding

Bemærkninger	Ja: ☒ Nej: ☐
--------------	---

Generelle bemærkninger:

Pænt og velholdt værk.

Beliggenhed: Frederikssundsvej 167, 3310 Ølsted

Med venlig hilsen

Louise Just Johansen

STAMDATA	
Vandforsyningens navn	Ølsted Strands Vandværk
Vandforsyningens CVR/P-nr.	2164 9414
Anlæggets navn	Ølsted Strand Vandværk
Adresse	Frederikssundsvej 167, 3310 Ølsted
Kontaktperson	Peter Jeppesen
Formand for anlægget/forsyningschef	Peter Jeppesen
Telefonnummer til formand / kontaktperson	20169277
Jupiter ID	83259
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	40.000 m ³ /år – udløber 2046
Indvinding seneste år (2023)	31.588 m ³
Antal kunder, opgjort efter antal målere	597
Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se §13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn):	Angiv steder og bemærkninger: Vandværket Julemærkehjemmet Kildehøjvej 46

BAGGRUNDSDATA			
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt:	Ja: (x)	Nej:	Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil: Der er tilbagevendende, men ikke konsekvente udfordringer med kim på prøvetagningsstedet Julemærkhjemmet. - se nedenfor 1)
Ledelsessystemer:	Ja: x	Nej:	Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Blue Control
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	Ja: (x)	Nej:	Resultat af kontrolprogram: Der er udfordringer med at få mails igennem fra ALSGlobal, kommunen er i dialog.
Foreligger egen tilstandsrapport?	Ja: x	Nej:	Dato og bemærkninger:
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere	Ja: x	Nej:	Dato og bemærkninger: De har løbende besøg af Dahlgaard - se nedenfor 2)
Har vandforsyningen en beredskabsplan	Ja: x	Nej:	Bemærkninger: se nedenfor 3)
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand?	Ja: x	Nej:	Bemærkninger: fra 2 punkter
Navn/adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand			Halsnæs Forsyning
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm:	Ja: x	Nej:	Bemærkninger: Kan nødforsynes via beredskabet.
Foreligger vedligeholdelsesplan ¹	Ja: x	Nej:	Bemærkninger: Dahlgaard rapport
Har kommunen udarbejdet en indsatsplan:	Ja: x	Nej:	
Er den kommunale indsatsplan fulgt	Ja: (x)	Nej:	Der skal gennemføres dialog med nabolandmænd for overholdelse af 25 meter dyrknings, sprøjtning og gødskningsfri zone omkring alle 3 borer - se nedenfor 4)
Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen ²	Ja: x	Nej:	Bemærkninger:
Dato for sidste godkendte takstblad			Takstblad 2024 er godkendt.
Dato for sidste information sendt til forbrugerne			Løbende opfølgning og nyheder på hjemmesiden.

1. Udfordringerne med Kim ved prøvetagningsstedet startede i 2021. Det er i 2022 aftale at undersøge en prøve udtaget fra en anden hane (end den med bruser). Det ser ud som om at en efterfølgende prøve var ren. Jeg kan ikke se om der er skiftet prøvetagningshane permanent i mine sagsakter. Vandværket undersøger nærmere.
2. Vandværket er i gang med et projekt hvor de skal have udskiftet eternithovedledningen (NORD) og generelt udskiftning af ledninger på nettet. Derudover vil vandværket gerne opsætte solceller ved Boring 2. De forventer at søge kommunegaranti til økonomien i projekterne.
3. Vandværket fremsender en opdateret beredskabsplan, og indarbejder at der fremsendes en kopi til kommunen, når der foretages rettelser/opdateringer.
4. Der er indtegnet 25 meter beskyttelseszone om hver af de 3 borer. 25 meter zonen er dyrknings-, sprøjtning- og gødskningsfri jf. §21b i Miljøbeskyttelsesloven og vandværket bør have dialog med de pågældende landmænd om at holde sig udenfor 25 meter zonen.

¹ Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: Boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet

² Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. § 28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.



PRODUKTION
VANDVÆRKSBYGNINGEN


Aflåst:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikret mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:

VEDLIGEHODELSESTILSTAND

Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ind. Vedligeholdelse af bygning:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumper.....Antal:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alder: Pumpe i boringerne					
Rentvandspumper.....Antal: 3			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alder:					
Interne pumper..... Antal:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alder: 2001					
Hydrofor..... .Antal:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Størrelse på Hydrofor:					
Placering / mærkning af prøvetagningshane:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Hjælpemaskiner fx kompressor:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Kompressor til iltningen					
Vandmåler Råvand:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er i boringerne					
Vandmåler Skyllvand:	Ja:	Nej: x	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ingen krav i indvindingstilladelse					

Vandmåler Afgang: Der er 3 vandmålere på afgang	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
SRO-anlæg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Affugtningsanlæg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.:	Ja:	Nej: x	Hvilke:		
Tilbagefølsventiler og styreorganer:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Afløbsforhold:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod optrængning af kloakvand:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod indtrængning af regnvand:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Synlige rør:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger: De gamle afløb gennem rentvandstank er nu afblændet og ført uden om huset. Der er ikke wc i vandværket.

Rentvandspumperne er frekvensstyret, der er en samlet max. Kapacitet på 32 m³/t.

Der er ingen måler på skyllevand, der benyttes imidlertid ca. 7 ½ m³ til hvert filter og det tager ca. 15 minutter.

Vandmålerne på afgang værk er placeret så der er en på hovedledningen, en på sydledningen og en på nordledningen.



ILTNING / FILTERANLÆG

Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Type Iltningsanlæg: Iltningsskassetter, der får luft via kapselblæser er placeret i gammelt iltningstårn.					
Iltningsanlæg:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Iltningsaggregater: kompressor	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Reaktionsbassin:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Åbne filteranlæg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Trykfilteranlæg:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der etableret rottespærre:	Ja: x	Nej:			
Anden Vandbehandling:					



Bemærkninger:

Ældre iltningstrapper vil blive fjernet på sigt.

Maling og renovering af filterrum er gennemført

Filtrene er to parallelle filtre med en total kapacitet på 50 m³.



RENTVANDSBEHOLDER



Rentvandsbeholder:	Ja: x	Nej:	Beliggende under vandværksbygning		
Beliggenhed over terræn:	Ja:	Nej: x			
Volumen (m³): 160 m³					
Indhegnet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætliggende beplantning og/eller træerødder:	Ja:	Nej: x	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udvendig vedligeholdelse:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Indvendig vedligeholdelse:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion:31. oktober 2023 uden kommentarer – inspektion foretages hvert andet år.					
Beholderinspektion udført af (person): Dahlgaard					
Fri for utætheder (synlige):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge eller lem: Adgang fra værket.	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætssluttende låg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilations åbning beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for høj vandstand:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for lav vandstand:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Overløbsrør beskyttet:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Er der prøveudtagningshaner	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand:			Ja:	Nej: x	Type:

Bemærkninger:

Adgang til rentvandsbeholder i filtersalen. Fin kant og med selvstændig lås.

Der er til 3 dages vinterforbrug eller 1 ½ dages sommerforbrug i rentvandsbeholderen.

SKYLLEVAND

Skyllefrekvens: Ved 900 m³ vand. Om vinteren dog ved 1.500 m³. eller efter 200 timer.

Skylning med rent vand (x) råvand ()

Bundfældningsbassin:	Ja: x	Nej:	Henstand i timer: 5-6 timer		
Indhegnet: med vandværket	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge: En del af indhegning til værket.	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udledning af skyllevand	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Genbrug af skyllevand:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel: x	Dårlig:

Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand:

Ikke kendt.

Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam:

Sker via Dahlgaard

Bemærkninger:

Slambassin er åbent med stejle sider af fliser, der er trin indbygget i den ene side. Der stod siv og større vækster i bunden og på nogle af siderne. Skal med års mellemrum renses op. Afleder til mindre nærliggende sø.

Det er 3 år siden sidst den er tømt for slam.



Der er 2 indløb i slambassinet – tagvand og skyllevand.

DISTRIBUTION					
Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand:			Halsnæs Forsyning (beredskab)		
VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER: Ingen højdebeholder.					
Vandtårn / Højdebeholder:	Ja:	Nej:			
Mulighed for prøvetagning på vandtårn:	Ja:	Nej:			
Tætssluttende tag/låg:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm ved uvedkommende indtrængen:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm ved høj vandstand:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Skadedyrssikring ved udluftning:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Beskyttet ventilationsåbning:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion:					
Bemærkninger:					
LEDNINGSNET					
Karakter af tegningsmateriale (f.eks. digitalt): Digitalt					
RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet):					
Samlet længde:	Ca. 13,5 km				
Sektionering:	"Nord" og 2 sektioner i "syd"				
Alder på udpumpningsanlæg:	2001				
Materiale:	Flere forskellige materialer.				
Årligt tab på ledningsnet (m³):	6,5 % i 2017				
Natforbrug (m³/time):	1 m³				
Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl.	Ikke relevant, da meget få virksomheder.				
Er der brandhaner på ledningsnettet:	Flere i sommerhusområderne.				
Bemærkninger:					
Vandværket vil gerne i dialog med beredskabet om, hvilke brandhaner skal benyttes/vedligeholdes fremover. Dette vil blive taget op i forbindelse med projektet for renovering af hovedledningen, og det vil også blive et emne ifm. Vandforsyningsplanen.					
Trykforøgningssektion:	Ja:	Nej: x			
Trykreduktionssektion:	Ja:	Nej: x			
Brønde på ledningsnettet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsbrønde:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:

INDVINDING					
BORING: Tæt på vandværksbygning.			DGU NR.: 192.837 B1		
					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja :x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig: x
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		
Bemærkninger: Der ses dyrkning og sprøjtespor på ortofoto på side 4					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn: x			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Rørgennemføringerne i bunden af boringshuset er ikke støbt til. Der kan trænge mindre dyr og insekter ind i boringshuset. Det foreslås at lukke rørgennemføringerne. Rørene er varmetreeset for at sikre rørene om vinteren pga lavt forbrug.					

³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Top af studs.					
Prøvetagningsshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	6 m				
Alder på indpumpningsanlæg:	1979				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					

INDVINDING					
BORING: Boring 2 er ca. 150 fra værket. På vandværkets grund.			DGU NR.: 192.330 (B2)		
					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁴					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig: x
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		
Bemærkninger: Der ses dyrkning og sprøjtespor på ortofoto på side 4					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn: X			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

⁴ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Bemærkninger:

Rørgennemføringerne i bunden af boringshuset er ikke støbt til. Der kan trænge mindre dyr og insekter ind i boringshuset. Det foreslås at lukke rørgennemføringerne.

BORING / BRØND

Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: X	Dårlig:

Angivelse af pejlepunkt: Der er installeret automatisk pejling, der er ikke mulighed for manuel pejling.

Prøvetagningshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:

RÅVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	150 m
Alder på indpumpningsanlæg:	1979
Materiale:	PVC

Bemærkninger:

INDVINDING

BORING: Boring 3 ca. 300 m fra værket. Ligger på værket grund i mindre granbevoksning.



DGU NR.: 192.192.1381 B3




Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):⁵

Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: x	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig: x
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		

Bemærkninger:

Der er plantet juletræer indenfor BNBO og indenfor 25 meter zonen.

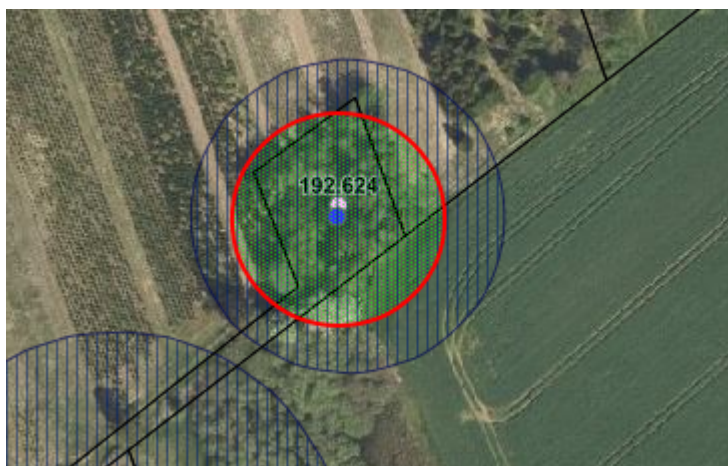

Der ses dyrkning og sprøjtespor på ovenstående ortofoto indenfor 25 meter.

⁵ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn: x			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Rørgennemføringerne i bunden af boringshuset er støbt til siden sidste tilsyn, og der var ingen dyr at se i boringshuset.					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Der er isat automatisk pejling, og der er også plads til manuel pejling.					
Prøvetagningsshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	320 m				
Alder på indpumpningsanlæg:	2010				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
